

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION & LAPORAN ESTIMASI PROYEK

AyokMendaki

Platform Marketplace Pendakian

PT. AyokMendaki Teknologi Indonesia

Tim: Rayhan Abdul Fikri (PM)

Muhammad Ubaidillah Rosyid (Full-Stack)

Ryan Anugrah (UI/UX)

Mei 2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	1
1.3	Ruang Lingkup	1
1.4	Batasan Masalah	1
1.5	Nama Software	2
1.6	Definisi dan Singkatan	2
1.7	Referensi	2
1.8	Penjelasan Umum	2
1.8.1	Uraian Singkat	2
1.8.2	Fitur Utama Software	3
2	Gambaran Umum	4
2.1	Karakteristik Pengguna	4
2.2	Hak Akses Pengguna	4
2.3	Model Bisnis	4
2.4	Ketergantungan Software	5
2.5	Spesifikasi Pendukung Software	5
3	Analisis Kebutuhan	6
3.1	Identifikasi Aktor	6
3.2	Identifikasi Use Case	6
3.2.1	Use Case Diagram	6
3.3	Skenario Use Case	7
3.3.1	Login Pendaki	7
3.3.2	Booking Guide	7
3.3.3	Sewa Alat	8
3.3.4	Login Guide & Manajemen Booking	8
3.3.5	Login Admin & Verifikasi	8
3.4	Kebutuhan Non-Fungsional	8
4	Estimasi Proyek: Function Point + CoCoMo	9
4.1	Alur Metodologi	9
4.2	Crude Function Point (CFP)	9
4.2.1	Rekapitulasi CFP	9
4.2.2	Visualisasi Distribusi Komponen FP	10
4.3	Relative Complexity Adjustment Factor (RCAF)	10
4.4	Perhitungan Function Point	11
4.5	Estimasi Ukuran Proyek (LOC)	11

4.6	Basic CoCoMo	11
4.6.1	Parameter Tipe Proyek: Semi-Detached	11
4.6.2	Hasil Perhitungan CoCoMo	12
4.6.3	Visualisasi Perbandingan Skenario	12
4.7	Timeline Proyek (Skenario Lean — Direkomendasikan)	12
4.8	Ringkasan Eksekutif & Rekomendasi	13
4.8.1	Rekomendasi	13
4.8.2	Catatan Penting	13
5	Kontrak Kerja	14
5.1	Metodologi dan Realita Tim	14
5.2	Estimasi Biaya Lean	14
5.3	Perbandingan Skenario Estimasi	15
5.4	Komposisi Tim & Gaji per Bulan (Skenario Lean)	16
5.5	Kontrak dan Perjanjian	16
5.5.1	Identitas Pihak Pertama	16
5.5.2	Identitas Pihak Kedua	16
5.5.3	Ketentuan Perjanjian	16

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Aktivitas pendakian gunung di Indonesia terus meningkat, namun calon pendaki menghadapi berbagai hambatan: sulitnya menemukan guide bersertifikasi terpercaya, tidak adanya platform terpadu untuk penyewaan alat, keterbatasan informasi jalur dan cuaca, serta tidak adanya ekosistem digital yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan.

AyokMendaki hadir sebagai *marketplace connector*, bukan operator trip, yang menghubungkan Pendaki, Guide Profesional, dan Vendor Rental Alat.

1.2 Tujuan

1. Membangun platform marketplace berbasis web (Laravel + VueJS) dan mobile (React Native).
2. Menjadi platform discovery terpercaya dengan sistem verifikasi dokumen, escrow, dan review transparan.
3. Menyediakan estimasi proyek yang **realistis dan berbasis fakta pasar**, menggantikan asumsi konservatif yang tidak sesuai kondisi startup SaaS lokal saat ini.

1.3 Ruang Lingkup

AyokMendaki adalah *two-sided marketplace* dengan cakupan:

- Platform web dan aplikasi mobile.
- Empat jenis pengguna: Pendaki, Guide Profesional, Vendor Rental Alat, dan Super Admin.
- *Core value*: Discovery, Matching, Booking, Pembayaran Escrow, Review & Rating, In-App Chat.

1.4 Batasan Masalah

- Platform memerlukan koneksi internet aktif.

- AyokMendaki tidak bertanggung jawab atas keselamatan fisik selama pendakian; tanggung jawab berada pada guide dan pendaki masing-masing.
- Tidak menyediakan sistem emergency response atau tracking GPS real-time; pembaruan lokasi manual melalui check-in poin oleh guide.
- Vendor bertanggung jawab atas akurasi stok yang diinput.
- Guide wajib memiliki sertifikasi resmi (APIGI, HPI, atau setara).
- Vendor wajib memiliki izin usaha valid minimal tingkat UKM.

1.5 Nama Software

AyokMendaki

1.6 Definisi dan Singkatan

No	Istilah	Definisi
1	Laravel	Framework PHP untuk backend web
2	VueJS	Framework JavaScript untuk frontend web
3	React Native	Framework JavaScript untuk aplikasi mobile cross-platform
4	Escrow	Sistem pembayaran di mana dana ditahan platform dan diteruskan setelah layanan selesai
5	APIGI	Asosiasi Profesi Indonesia Guide Gunung
6	HPI	Himpunan Profesi Indonesia
7	Check-in Point	Titik pembaruan status perjalanan yang di-input manual oleh guide
8	Payment Gateway	Layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran digital; Midtrans/Xendit tidak memungut biaya setup

1.7 Referensi

Dokumen ini disusun merujuk pada praktik SRS, Function Point Analysis, Basic CoCoMo, serta riset harga pasar infrastruktur cloud dan payment gateway Indonesia Mei 2026.

1.8 Penjelasan Umum

1.8.1 Uraian Singkat

AyokMendaki adalah platform marketplace pendakian gunung yang menghubungkan tiga pihak utama: Pendaki (customer), Guide Profesional (jasa pemanduan), dan

Vendor Rental (penyewaan alat outdoor). Platform berperan sebagai perantara terpercaya dengan verifikasi, escrow, dan review.

1.8.2 Fitur Utama Software

- Discovery gunung, jalur, tingkat kesulitan, dan informasi cuaca.
- Booking guide profesional dengan verifikasi sertifikasi.
- Penyewaan alat outdoor dari vendor terverifikasi.
- Pembayaran aman berbasis escrow melalui payment gateway.
- In-app chat untuk komunikasi antar pihak.
- Review dan rating transparan.
- Check-in progress manual oleh guide.
- Dashboard admin untuk verifikasi dan monitoring.

Bab 2

Gambaran Umum

2.1 Karakteristik Pengguna

Aktor	Karakteristik
Pendaki	Pengguna umum, familiar dengan aplikasi mobile dan platform booking online
Guide Profesional	Profesional bersertifikasi, familiar prosedur keselamatan, kemampuan dasar smartphone
Vendor Rental	Pelaku usaha penyewaan alat outdoor, familiar manajemen stok sederhana
Super Admin	Tim internal, familiar manajemen konten, verifikasi dokumen digital, monitoring transaksi

2.2 Hak Akses Pengguna

No	Pengguna	Status	Hak Akses
1	Pendaki	User	Discovery, booking guide, sewa alat, community trip, in-app chat, review
2	Guide Profesional	User	Kelola profil & jadwal, terima/tolak booking, update check-in, chat
3	Vendor Rental	User	Kelola katalog, konfirmasi penyewaan, chat dengan pendaki
4	Super Admin	Super User	Verifikasi, monitoring transaksi, dispute resolution, laporan

2.3 Model Bisnis

AyokMendaki beroperasi sebagai marketplace dua sisi dengan model komisi:

- Platform memungut komisi dari setiap transaksi booking guide dan sewa alat.
- Guide dan Vendor mendaftar gratis namun wajib verifikasi dokumen sebelum listing.
- Platform tidak terlibat operasional trip di lapangan.

- Sistem escrow melindungi dana pendaki hingga layanan selesai.

2.4 Ketergantungan Software

- Koneksi internet aktif.
- Integrasi payment gateway (Midtrans/Xendit) — **gratis setup, biaya hanya per transaksi sukses.**
- Google Maps API — **free tier tersedia untuk tahap awal.**
- Layanan cuaca (BMKG API gratis atau OpenWeatherMap free tier).
- Email/SMS gateway untuk notifikasi.

2.5 Spesifikasi Pendukung Software

- Backend: Laravel (PHP).
- Frontend Web: VueJS.
- Mobile: React Native.
- Basis data dan API mendukung transaksi multi-role.

Bab 3

Analisis Kebutuhan

3.1 Identifikasi Aktor


Sistem melibatkan empat aktor utama: Pendaki, Guide, Vendor, dan Super Admin.

3.2 Identifikasi Use Case

No	Use Case	Deskripsi
1	Discovery Gunung	Pendaki melihat detail gunung, jalur, estimasi waktu, tingkat kesulitan, cuaca
2	Booking Guide	Pendaki memilih jadwal dan membooking guide; guide menerima/menolak
3	Sewa Alat	Pendaki memilih alat, tanggal ambil & kembali; vendor konfirmasi ketersediaan
4	Pembayaran Escrow	Dana ditahan platform, diteruskan setelah layanan selesai
5	In-App Chat	Komunikasi internal antara pendaki dengan guide atau vendor
6	Review & Rating	Pendaki memberikan ulasan dan rating setelah trip selesai
7	Check-in Progress	Guide mengupdate status perjalanan: Berangkat, Basecamp, Summit, Finish
8	Admin Panel	Verifikasi dokumen, monitoring transaksi, dispute resolution, laporan

3.2.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara aktor dan fungsi utama sistem AyokMendaki. Diagram ini membantu memastikan cakupan kebutuhan fungsional dapat dipahami secara cepat sebelum skenario use case dijelaskan lebih detail.

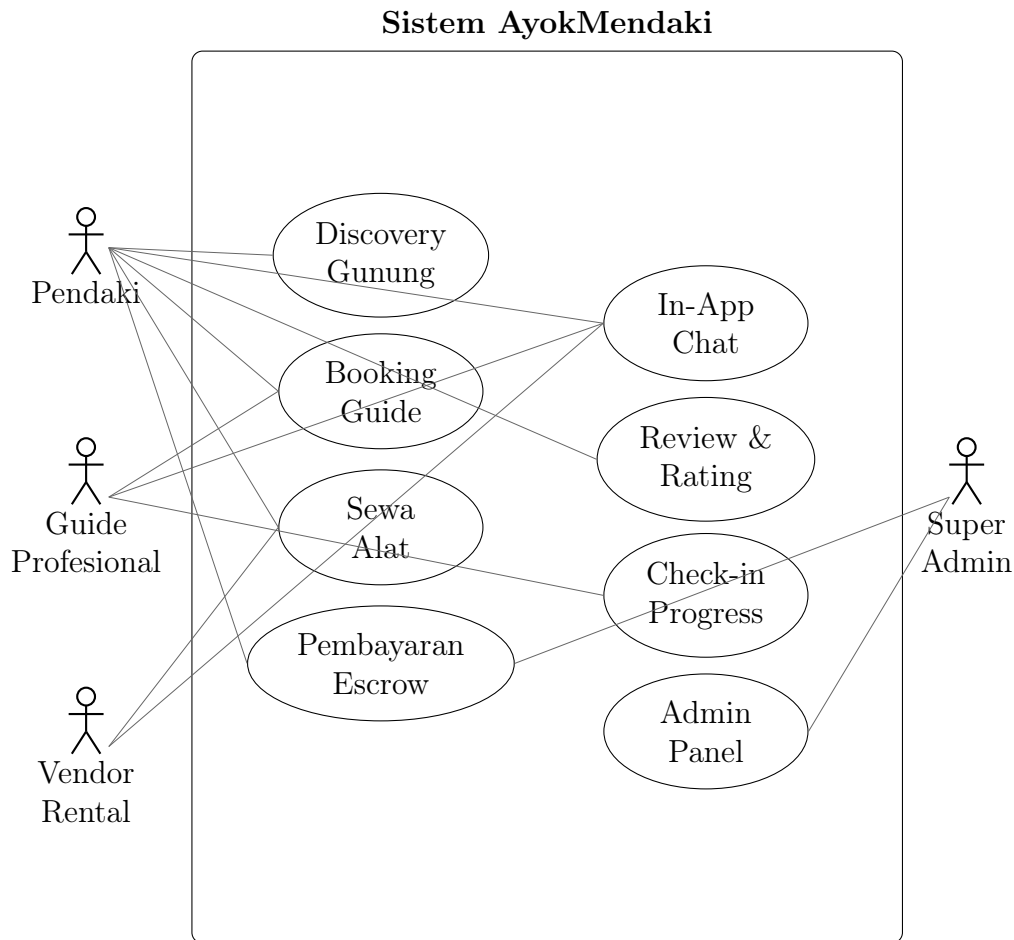

Gambar 3.1: Use Case Diagram Sistem AyokMendaki

3.3 Skenario Use Case

3.3.1 Login Pendaki

- Aktor: Pendaki.
- Prasyarat: Akun telah terdaftar.
- Alur utama: Pendaki membuka halaman login, memasukkan email dan kata sandi, sistem memverifikasi kredensial.
- Hasil: Pendaki mengakses dashboard, discovery, booking, chat, dan riwayat.

3.3.2 Booking Guide

- Aktor: Pendaki dan Guide Profesional.
- Prasyarat: Pendaki login dan guide tersedia pada tanggal dipilih.
- Alur utama: Pendaki melihat profil guide, memilih jadwal, mengirim booking; guide menerima atau menolak.
- Hasil: Jika diterima, sistem membuat transaksi dan meneruskan ke pembayaran escrow.

3.3.3 Sewa Alat

- Aktor: Pendaki dan Vendor Rental.
- Prasyarat: Pendaki login dan alat tersedia.
- Alur utama: Pendaki memilih alat, menentukan tanggal ambil dan kembali; vendor mengonfirmasi ketersediaan.
- Hasil: Sistem membuat pesanan sewa alat dan melanjutkan ke proses pembayaran.

3.3.4 Login Guide & Manajemen Booking

- Aktor: Guide Profesional.
- Prasyarat: Akun guide telah diverifikasi admin.
- Alur utama: Guide login, meninjau booking masuk, menerima/menolak, memperbarui status perjalanan via check-in manual.
- Hasil: Pendaki menerima status terbaru dan histori layanan tersimpan.

3.3.5 Login Admin & Verifikasi

- Aktor: Super Admin.
- Prasyarat: Admin memiliki kredensial yang valid.
- Alur utama: Admin login, memeriksa dokumen guide/vendor, memverifikasi atau menolak pendaftaran, memonitor transaksi.
- Hasil: Hanya akun terverifikasi yang dapat beroperasi.

3.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Autentikasi JWT, enkripsi data sensitif, HTTPS wajib, rate limiting API
Performa	Halaman utama loading < 3 detik (4G), respons API < 500 ms
Skalabilitas	Arsitektur cloud hosting dengan horizontal scaling
Ketersediaan	Uptime target 99.5% per bulan, maintenance terjadwal
Privasi Data	Kepatuhan regulasi perlindungan data pribadi

Bab 4

Estimasi Proyek: Function Point + CoCoMo

4.1 Alur Metodologi

Tahapan estimasi mengikuti urutan:


1. Identifikasi Komponen FP (EI, EO, EQ, ILF, EIF)
2. Hitung Crude Function Point (CFP)
3. Hitung Relative Complexity Adjustment Factor (RCAF) — 14 Cost Drivers
4. Hitung Function Point (FP)
5. Konversi ke LOC dan Basic CoCoMo (Effort, Duration, Staffing)

4.2 Crude Function Point (CFP)

4.2.1 Rekapitulasi CFP

No	Komponen FP	Simple	Average	Complex	Bobot	Total
1	External Input (EI)	3 (9)	4 (16)	4 (24)	3/4/6	68
2	External Output (EO)	3 (12)	10 (50)	3 (21)	4/5/7	83
3	External Inquiry (EQ)	2 (6)	8 (32)	0 (0)	3/4/6	38
4	Internal Logical Files (ILF)	2 (14)	9 (90)	1 (15)	7/10/15	119
5	External Interface Files (EIF)	2 (10)	2 (14)	1 (10)	5/7/10	34
TOTAL CFP						342

4.2.2 Visualisasi Distribusi Komponen FP

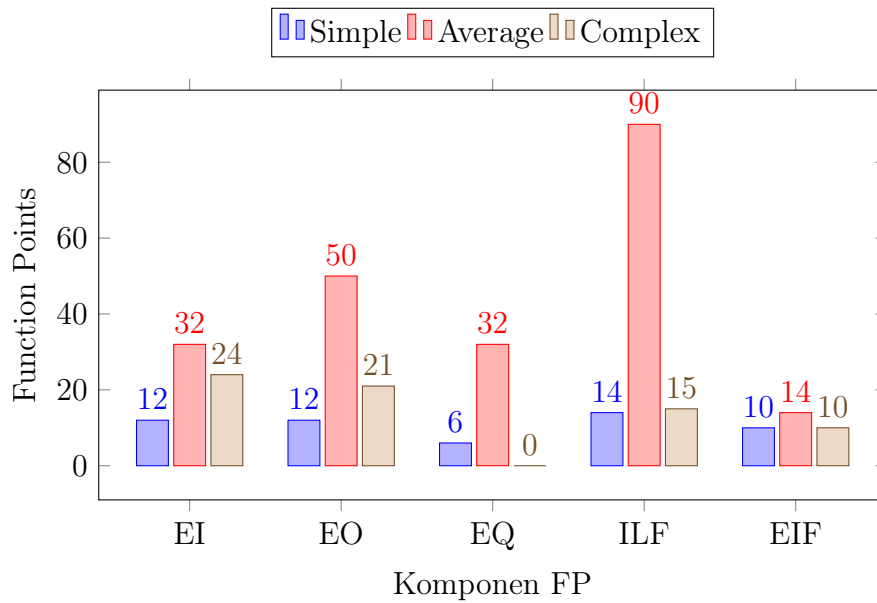

4.3 Relative Complexity Adjustment Factor (RCAF)

No	Karakteristik	Skor	Dampak
1	Tingkat Kompleksitas Komunikasi Data	5	Essential
2	Tingkat Kompleksitas Pemrosesan Terdistribusi	4	Signifikan
3	Tingkat Kompleksitas Performance	4	Signifikan
4	Tingkat Kompleksitas Konfigurasi	3	Rata-rata
5	Tingkat Frekuensi Penggunaan Software	4	Signifikan
6	Tingkat Frekuensi Input Data Online	5	Essential
7	Tingkat Kemudahan Penggunaan Bagi User	4	Signifikan
8	Tingkat Frekuensi Update Data (ILF Online)	4	Signifikan
9	Tingkat Kompleksitas Pemrosesan Data	4	Signifikan
10	Tingkat Kemungkinan Penggunaan Kembali Kode	3	Rata-rata
11	Tingkat Kemudahan Instalasi	2	Moderat
12	Tingkat Kemudahan Operasional	3	Rata-rata
13	Tingkat Software untuk Multi-Organisasi	3	Rata-rata
14	Tingkat Fleksibilitas Mengikuti Perubahan	3	Rata-rata
TOTAL $\sum F_i$ (RCAF)		51 / 70	

4.4 Perhitungan Function Point

Formula Function Point

$$FP = CFP \times (0.65 + 0.01 \times \sum F_i)$$

$$FP = 342 \times (0.65 + 0.01 \times 51)$$

$$FP = 342 \times 1.16 = \mathbf{396.72}$$

4.5 Estimasi Ukuran Proyek (LOC)

Berdasarkan riset pasar dan penggunaan framework modern (Laravel, VueJS, React Native) yang sangat mature dengan ekosistem package siap pakai (Sanctum, Socialite, komponen UI), nilai **LOC/FP** = **53** terlalu konservatif untuk proyek ini. Nilai realistis untuk pengembangan berbasis framework modern adalah **LOC/FP** = **30** (Skenario Lean).

Parameter	Skenario Konservatif	Skenario Lean
Hasil perhitungan Function Point (FP)	396.72	396.72
LOC/FP	53 (PHP historis)	30 (OOP/Framework)
Productivity Factor	—	—
Total LOC	21.026	11.902
Total KLOC	21.03	11.90
Digunakan CoCoMo	Ya	Ya (Direkomendasikan)

4.6 Basic CoCoMo

4.6.1 Parameter Tipe Proyek: Semi-Detached

Proyek ini dikategorikan *Semi-Detached* karena melibatkan transaksi database, integrasi API, dan tim dengan pengalaman campuran.


Tipe Proyek	C_a	M_a	C_b	M_b	Karakteristik
Organic	2.4	1.05	2.5	0.38	Kecil & sederhana
Semi-Detached	3.0	1.12	2.5	0.35	Transaksi database, integrasi API
Embedded	3.6	1.20	2.5	0.32	Real-time kritis

4.6.2 Hasil Perhitungan CoCoMo


Metrik	Simbol	Skenario Konservatif (8 org, 12 bln)	Skenario Lean (5 org, 10 bln)
Ukuran Proyek	KLOC	21.03	11.90
Effort	E	90.91 MM	48.06 MM
Jam Kerja	$E \times 152$	13.818 jam	7.306 jam
Durasi	D	12.12 bulan	9.70 bulan
Produktivitas	P	0.2313 KLOC/MM	0.2476 KLOC/MM
Rata-rata Staf	AVG	$7.50 \approx 8$ orang	$4.96 \approx 5$ orang

Catatan: Skenario lean dengan 5 orang dan ≈ 10 bulan dipilih sebagai baseline perencanaan karena lebih selaras dengan kebutuhan startup, cakupan MVP, dan komposisi tim yang diperjelas pada Bab 5.

4.6.3 Visualisasi Perbandingan Skenario

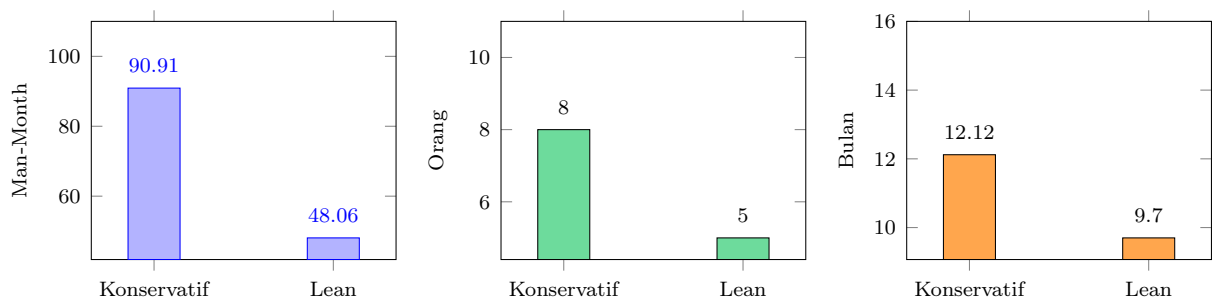

4.7 Timeline Proyek (Skenario Lean — Direkomendasikan)

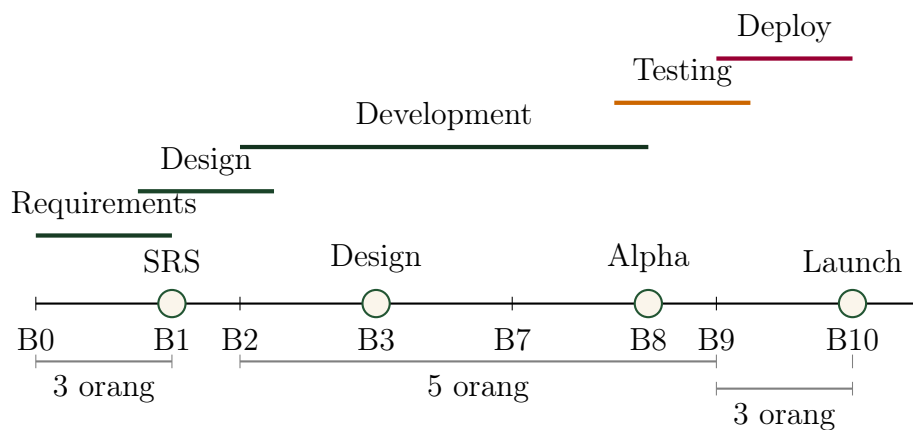

4.8 Ringkasan Eksekutif & Rekomendasi

Ringkasan Estimasi AyokMendaki

CFP Total	: 342
Function Point (FP)	: 396.72
Ukuran Kode	: 11.90 KLOC (Skenario Lean, LOC/FP = 30)
Effort	: 48.06 Man-Month
Durasi	: 9.7 Bulan ($\approx$ 10 Bulan)
Tim	: 5 Orang
Est. Biaya Dev	: $\approx$ Rp 450.000.000
Est. Biaya Total	: $\approx$ Rp 570.500.000
Efisiensi Anggaran	: Struktur biaya lean dan terukur

4.8.1 Rekomendasi

- **Gunakan Skenario Lean (5 orang, $\approx$ 10 bulan)** sebagai dasar perencanaan. Tim lean ini lebih sesuai karakter startup dan mengurangi burn rate secara signifikan.
- **Komposisi Tim Ideal:** 1 Project Manager, 2 Full-Stack Developer (Laravel + VueJS), 1 Mobile Developer (React Native), 1 UI/UX + QA.
- **Manajemen Risiko:** Skor tinggi pada komunikasi data dan input online menunjukkan perlunya infrastruktur server andal, namun tidak perlu over-provision di tahap awal.

4.8.2 Catatan Penting

Estimasi ini bersifat awal berdasarkan SRS. Akurasi FP bergantung pada kelengkapan spesifikasi. Re-estimasi disarankan setelah *detailed design* selesai. Dasar estimasi menggunakan biaya infrastruktur yang realistis dan pengakuan bahwa framework modern (Laravel, Vue, React Native) menurunkan LOC/FP secara signifikan dibandingkan PHP prosedural historis.

Bab 5

Kontrak Kerja: Estimasi Realistis Berbasis Pasar

5.1 Metodologi dan Realita Tim

Perencanaan ini menggunakan **skenario lean (5 orang $\times$ 10 bulan)** yang konsisten dengan kebutuhan operasional startup. Komposisi tersebut mencakup tim inti dan penambahan 2 tenaga ahli (mobile dev dan full-stack tambahan) sebagai kontraktor/freelancer tetap.

5.2 Estimasi Biaya Lean

Berdasarkan riset harga pasar Mei 2026, estimasi biaya disusun dengan pendekatan lean agar sesuai untuk tahap MVP dan operasional awal. Perhitungan tidak menggunakan asumsi enterprise yang terlalu besar, melainkan fokus pada kebutuhan inti produk, efisiensi tim, dan pemanfaatan layanan cloud serta API yang memiliki free tier atau biaya awal rendah.

Asumsi utama estimasi biaya adalah sebagai berikut:

- Durasi pengembangan menggunakan baseline 10 bulan dengan tim inti 5 orang.
- Infrastruktur menggunakan VPS/cloud lokal kelas menengah yang dapat ditingkatkan bertahap sesuai trafik.
- Payment gateway, SSL, Google Maps, dan layanan cuaca memanfaatkan opsi free setup/free tier untuk fase awal.
- Maintenance dihitung untuk 1 tahun setelah rilis, berfokus pada bug fix, minor update, monitoring, dan dukungan operasional.

Rincian biaya lean ditampilkan pada tabel berikut:

Komponen Biaya	Estimasi Lean	Keterangan / Dasar Estimasi
Development	Rp 450.000.000	5 org $\times$ 10 bln $\times$ rata-rata Rp 9 jt/bln. Detail pada Tabel 5.3.
Server Cloud (1 tahun)	Rp 42.000.000	VPS lokal Indonesia (Biznet Gio, Nevacloud, WarnaHost) tier 4 vCPU/8GB RAM $\approx$ Rp 3.5 jt/bln. Cukup untuk startup phase; bukan enterprise tier Rp 10 jt/bln.
Maintenance (1 tahun)	Rp 72.000.000	1 dev part-time (Rp 6 jt/bln) untuk bug fix, minor update, monitoring.
Domain & SSL	Rp 1.500.000	Domain .com/.id $\approx$ Rp 150–200 rb/tahun; SSL wildcard gratis via Let's Encrypt.
Integrasi API	Rp 5.000.000	Midtrans/Xendit: free setup , tidak ada biaya integrasi. Google Maps & BMKG: free tier cukup untuk MVP. Anggaran ini untuk cadangan custom development atau sandbox testing.
TOTAL BIAYA	Rp 570.500.000	Baseline anggaran lean untuk pengembangan, operasional awal, dan cadangan integrasi MVP.

Tabel 5.1: Breakdown Biaya Total Berbasis Fakta Pasar

5.3 Perbandingan Skenario Estimasi

Komponen	Skenario Konservatif	Skenario Lean	Catatan
Development	Rp 672 jt	Rp 360–480 jt	Tim 3–5 orang, 10–12 bln
Server cloud (1 thn)	Rp 120 jt	Rp 30–60 jt	Provider lokal/VPS
Maintenance (1 thn)	Rp 180 jt	Rp 80–100 jt	1 dev part-time
Domain & SSL	Rp 5 jt	Rp 1–2 jt	Let's Encrypt gratis
Integrasi API	Rp 80 jt	Rp 0–10 jt	Midtrans free setup
Total	Rp 1.057 jt	Rp 471–652 jt	Efisiensi $\sim$40–55%

Tabel 5.2: Perbandingan Skenario Estimasi Konservatif dan Lean

5.4 Komposisi Tim & Gaji per Bulan (Skenario Lean)

Role	Tanggung Jawab	Gaji/Bulan	Total (10 bln)
Project Manager	Koordinasi, SRS, klien, timeline	Rp 10.000.000	Rp 100.000.000
Full-stack #1	Laravel backend, API, database	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000
Full-stack #2	VueJS web, escrow flow, admin panel	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000
Mobile Dev	React Native (iOS + Android)	Rp 9.000.000	Rp 90.000.000
UI/UX + QA	Desain interface, prototyping, testing	Rp 8.000.000	Rp 80.000.000
Subtotal Development		Rp 45.000.000/bln	Rp 450.000.000

Tabel 5.3: Rincian Gaji Tim 5 Orang (10 Bulan)

5.5 Kontrak dan Perjanjian

5.5.1 Identitas Pihak Pertama

PT. AyokMendaki Teknologi Indonesia, diwakili oleh Rayhan Abdul Fikri selaku Direktur Utama, bertindak sebagai pihak developer.

5.5.2 Identitas Pihak Kedua

Pihak kedua adalah klien/pemesan pengembangan sistem AyokMendaki sebagaimana akan dicantumkan pada saat penandatanganan.

5.5.3 Ketentuan Perjanjian

1. Pihak pertama adalah pihak developer software.
2. Kebutuhan software telah dianalisis secara rinci dalam dokumen SRS ini.
3. Semua kebutuhan yang dirincikan telah disepakati oleh kedua pihak.
4. Penyelesaian software dilaksanakan dalam waktu **10 (sepuluh) bulan** terhitung sejak ditandatanganinya dokumen ini, dengan biaya sesuai estimasi biaya pada Bab 5.
5. Apabila terdapat kebutuhan tambahan atau perubahan setelah ditandatangani, akan ditambahkan waktu dan biaya berdasarkan kesepakatan tertulis.
6. AyokMendaki berposisi sebagai marketplace penghubung dan tidak bertanggung jawab atas operasional layanan yang dilakukan oleh guide maupun vendor di luar platform.
7. Dokumen ini ditandatangani oleh kedua pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Pihak Pertama,

Rayhan Abdul Fikri
Direktur Utama
PT. AyokMendaki Teknologi Indonesia

Pihak Kedua,

.....
Nama Pihak Kedua
Jabatan
